



UNIDOS TRANSFORMAMOS  
**ZACATLÁN**

— H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN —

REGISTRADO EN EL I. C. P. A. L. 2014/2018

# 2015

---

**SFU  
(PASH)  
CUARTO TRIMESTRE**



UNIDOS TRANSFORMAMOS  
**ZACATLÁN**

H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN

GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018



13 DE ENERO DE 2016

OFICIO No.DOP/001/2016

**JESÚS SÁNCHEZ RELIAC**  
**COORDINADOR GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL**  
**DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**PRESENTE:**

Quien suscribe Lic. Marcos Flores Morales, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Zacatlan, Pue. por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33 Fondo FISM y FORTAMUN, que se registraron en los Componentes Gestión de Proyecto, Financiero e Indicadores, en el Sistema de Formato Único del Portal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público(PASH) correspondiente al 4o. Informe Trimestral del ejercicio 2015, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto, Plantilla de Componente Financiero y Formato Componente Indicadores).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"




PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
ZACATLÁN, PUE

Lic. Marcos Flores Morales

Presidente Municipal de Zacatlan Puebla.

**NIVEL  
PROYECTO**

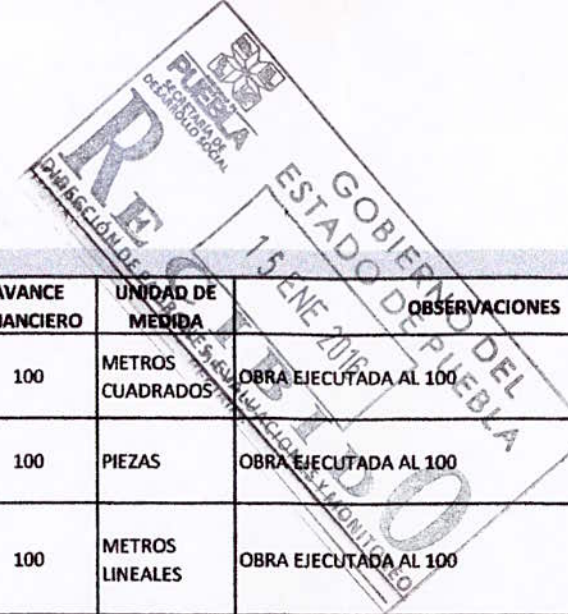


FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE15150200505611	2015012	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE ATZINGO - LA CUMBRE	ATZINGO - LA CUMBRE	FISM	\$ 1,476,930.19	\$ 1,476,930.19	100	100	METROS CUADRADOS	OBRA EJECUTADA AL 100
PUE00150400589579	2015015	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	ZACATLAN	FISM	\$ 366,210.00	\$ 366,210.00	100	100	PIEZAS	OBRA EJECUTADA AL 100
PUE00150400586552	2015025	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PLAN DE AYUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 541,037.55	\$ 541,037.55	100	100	METROS LINEALES	OBRA EJECUTADA AL 100
PUE00150400586584	2015026	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PLAN DE AYUTLA 2DA SECCION PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 149,019.98	\$ 149,019.98	100	100	METROS LINEALES	OBRA EJECUTADA AL 100
PUE15150200506797	2015033	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOXONACATLA	XOXONACATLA	FISM	\$ 1,685,558.12	\$ 1,685,558.12	100	100	METROS CUADRADOS	OBRA EJECUTADA AL 100
PUE00150400589826	2015039	ADQUISICION DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	ZACATLAN	FISM	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100	100	PIEZAS	OBRA EJECUTADA AL 100
PUE00150400589636	2015040	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	ZACATLAN	FISM	\$ 28,790.00	\$ 28,790.00	100	100	MOBILIARIO Y EQUIPO	OBRA EJECUTADA AL 100
PUE15150300553088	2015044	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2015 ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 3,375,974.37	\$ 3,375,974.37	100	100	METROS CUADRADOS	OBRA EJECUTADA AL 100
PUE15150300554496	2015053	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS ZACATLAN CLAVE 21DJN010088J	AYEHUALULCO	FISM	\$ 492,739.96	\$ 492,739.96	100	100	METROS CUADRADOS	OBRA EJECUTADA AL 100
PUE15150300555009	2015055	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21DPR 0828H EN LA LOCALIDAD DE ATZINGO	ATZINGO - LA CUMBRE	FISM	\$ 387,649.25	\$ 387,649.25	100	100	METROS CUADRADOS	OBRA EJECUTADA AL 100
PUE15150300555608	2015079	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN	ELOXOCHITLAN	FISM	\$ 1,767,626.68	\$ 1,767,626.68	100	100	METROS LINEALES	OBRA EJECUTADA AL 100
PUE00150400587017	2015080	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO Y MAQUIXTLA ,PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN	ZACATLAN	FISM	\$ 1,948,882.56	\$ 19,482,882.56	100	100	PIEZAS	OBRA EJECUTADA AL 100



ZACATLAN, PUEBLA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH

PUE00150400587066	2015081	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL (ALTO Y MEDIO) EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN	ZACATLAN	FISM	\$ 1,855,778.58	\$ 1,855,778.58	100	100	METROS CUADRADOS	OBRA EJECUTADA AL 100
PUE15150300556575	2015082	CONSTRUCCION DE NUEVA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA	JICOLAPA	FISM	\$ 1,729,550.13	\$ 1,729,550.13	100	100	METROS LINEALES	OBRA EJECUTADA AL 100
PUE15150300556597	2015083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO FIRME EN (AYEHUALULCO Y CUAUTILULCO) EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA	ZACATLAN	FISM	\$ 1,985,017.04	\$ 1,985,017.04	100	100	METROS CUADRADOS	OBRA EJECUTADA AL 100
PUE15150300556609	2015084	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHADOS EN COLONIAS POPULARES EN ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	ZACATLAN	FISM	\$ 1,985,017.04	\$ 1,985,017.04	100	100	METROS CUADRADOS	OBRA EJECUTADA AL 100
PUE15150300557281	2015085	REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE ATZINGO	ATZINGO - LA CUMBRE	FISM	\$ 204,902.27	\$ 204,902.27	100	100	METROS CUADRADOS	OBRA EJECUTADA AL 100
PUE00150400587202	2015086	CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS NIÑEZ MEXICANA CUAUTILULCO CLAVE 21DJN0403NN PRIMERA ETAPA	ZACATLAN	FISM	\$ 630,520.33	\$ 630,520.33	100	100	METROS CUADRADOS	OBRA EJECUTADA AL 100
PUE00150400587226	2015087	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA ETAPA QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE ATZINGO	ATZINGO - LA CUMBRE	FISM	\$ 1,487,382.15	\$ 1,487,382.15	100	100	METROS LINEALES	OBRA EJECUTADA AL 100
PUE00150400587409	2015088	CONSTRUCCION DE ESTUFAS PARA LA DISMINUCION DEL USO DE LEÑA	ZACATLAN	FISM	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	100	100	PIEZAS	OBRA EJECUTADA AL 100 CON INVERSION FISM 700,000, ESTATAL 2,638,000 Y BENEFICIARIOS 1.58
PUE00150400587246	2015089	AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LA GUADALUPANA	ZACATLAN	FISM	\$ 627,467.46	\$ 627,467.46	100	100	METROS LINEALES	OBRA EJECUTADA AL 100
PUE00150400587287	2015090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO FIRME EN ATZINGO AGEB No. 0270 EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN	ATZINGO - LA CUMBRE	FISM	\$ 33,039.43	\$ 33,039.43	100	100	METROS CUADRADOS	OBRA EJECUTADA AL 100 CON INVERSION DE FISM 33039.43 Y 748.93 DE INTERESES
PUE00150400587303	2015091	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION JUAN FRANCISCO LUCAS COLONIA MAQUIXTLA ZACATLAN, PUE.	MAQUIXTLA	FISM	\$ 276,192.26	\$ 276,192.26	100	100	METROS LINEALES	OBRA EJECUTADA AL 100
PUE00150400587650	2015092	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRFA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOXONACATLA	XOXONACATLA	FISM	\$ 40,277.93	\$ 40,277.93	100	100	METROS CUADRADOS	OBRA EJECUTADA AL 100 CON INVERSION DE INTERESES 40277.93
PUE15150100476485	2015CF001	CONSTRUCCION DE LA PREPARATORIA BUAP CAMPUS ZACATLAN SEGUNDA ETAPA 2014 EN LA COLONIA MAQUIXTLA	MAQUIXTLA	FISM	\$ 3,073,763.59	\$ 3,073,763.59	100	100	METROS CUADRADOS	OBRA PAGADA AL 100 CON CREDITO FAIS (BANOBRAS) A 3 AÑOS 8 MESES

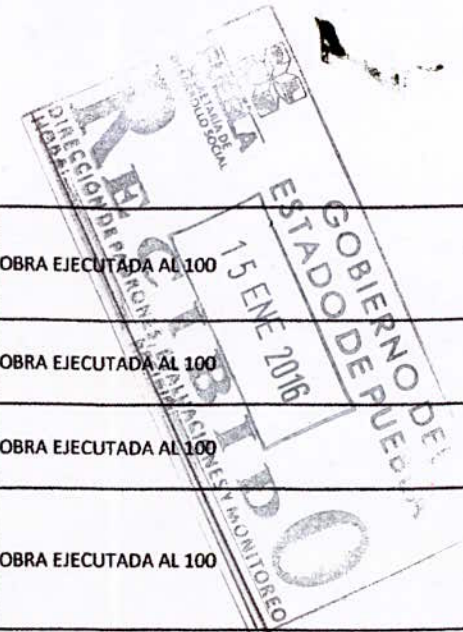




UNIDOS TRANSFORMAMOS  
**ZACATLÁN**

H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018

ZACATLAN, PUEBLA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH

PUE15150100476897	2015CF002	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) PARA LA LOCALIDAD DE TOMATLAN	TOMATLAN	FISM	\$ 4,620,070.79	\$ 4,620,070.79	100	100	METROS LINEALES	OBRA PAGADA AL 100 CON CREDITO FAIS (BANOBRAS) A 3 AÑOS 8 MESES
PUE15150200509655	2015CF003	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTORES MARGINALES Y EMISOR PARA LA LOCALIDAD DE TOMATLAN	TOMATLAN	FISM	\$ 18,252,926.11	\$ 18,252,926.11	100	100	METROS LINEALES	OBRA PAGADA AL 100 CON CREDITO FAIS (BANOBRAS) A 3 AÑOS 8 MESES
PUE15150200509785	2015CF004	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA 1 2015	ZACATLAN	FISM	\$ 1,948,892.58	\$ 1,948,892.58	100	100	LOTE	OBRA PAGADA AL 100 CON CREDITO FAIS (BANOBRAS) A 3 AÑOS 8 MESES
PUE15150200509922	2015CF005	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES ETAPA 2 2015	ZACATLAN	FISM	\$ 1,940,800.14	\$ 1,940,800.14	100	100	METROS CUADRADOS	OBRA PAGADA AL 100 CON CREDITO FAIS (BANOBRAS) A 3 AÑOS 8 MESES
PUE15150100476927	2015CF006	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES ETAPA 1 2015	ZACATLAN	FISM	\$ 1,751,801.72	\$ 1,751,801.72	100	100	METROS CUADRADOS	OBRA PAGADA AL 100 CON CREDITO FAIS (BANOBRAS) A 3 AÑOS 8 MESES



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 30

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Pres
PUE14150400507303	Construcción De Alcantarillado Sanitario De La Calle Prolongacion Juan Francisco Lucas Colonia Maquixtla Zacatlan, Pue	2015091	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	
PUE15150100476485	Construcción De La Preparatoria Buap Campus Zacatlan Segunda Etapa 2014 En La Colonia Maquixtla	2015CF001	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$3
PUE15150100476897	Construcción De Sistema De Agua Potable (Línea De Conduccion) Para La Localidad De Tomatlan	2015CF002	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4
PUE15150100476927	Construcción De Pisos Firmes Etapa 1 2015	2015CF006	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1
PUE15150200505611	Construcción De Planta De Tratamiento Para La Localidad De Atzingo-La Cumbre	2015012	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1
PUE15150200506797	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Xoxonacatla	2015033	Puebla	Zacatlán	Xoxonacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1
PUE15150200509655	Construcción De Alcantarillado Sanitario Colectores Marginales Y Emisor Para La Localidad De Tomatlan	2015CF003	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$18
PUE15150200509785	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Etapa 1 2015	2015CF004	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1
PUE15150200509922	Construcción De Pisos Firmes Etapa 2 2015	2015CF005	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1
PUE15150300553088	Mejoramiento De Vivienda 2015 Zacatlan, Puebla	2015044	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3
PUE15150300554496	Construcción De Un Aula En Jardín De Niños Zacatlan Clave 21djn040088j	2015053	Puebla	Zacatlán	Ayehualulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2015	
PUE15150300555009	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21dpr0828h En La Localidad De Atzingo	2015055	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2015	
PUE15150300555608	Ampliación De La Red De Alcantarillado En La Colonia De Eloxochitlan	2015079	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1

Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones
	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$276,196	\$276,196	\$276,196	\$276,196	\$276,196	\$276,196	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: FISM 2014, RENDIMIENTO 24.56, REINTEGRO OBRA 276,024.69 REINTEGRO A RENDIMIENTOS 147.01 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% CON RECURSOS QUE SE REINTEGRARON DE UNA OBRA DEL FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,073,764	\$3,073,764	\$3,073,764	\$3,073,764	\$3,073,764	\$3,073,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: CREDITO FAIS A 3 AÑOS 8 MESES / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% CON CREDITO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$4,620,071	\$4,620,071	\$4,620,071	\$4,620,071	\$4,620,071	\$4,620,071	100.00	\$0	Metros lineales	2,006	0.00	100.00	Financiera: CREDITO FAIS A 3 AÑOS 8 MESES / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,751,802	\$1,751,802	\$1,751,802	\$1,751,802	\$1,751,802	\$1,751,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: CREDITO FAIS A 3 AÑOS 8 MESES / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,476,930	\$1,476,930	\$1,476,930	\$1,476,930	\$1,476,930	\$1,476,930	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,800	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO LA OBRA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% EN EL ULTIMO TRIMESTRES DEL AÑO 2015 - LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,685,558	\$1,685,558	\$1,685,558	\$1,685,558	\$1,685,558	\$1,685,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$18,252,926	\$18,252,926	\$18,252,926	\$18,252,926	\$18,252,926	\$18,252,926	100.00	\$0	Metros lineales	4,820	0.00	100.00	Financiera: CREDITO FAIS A 3 AÑOS 8 MESES / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,948,893	\$1,948,893	\$1,948,893	\$1,948,893	\$1,948,893	\$1,948,893	100.00	\$0	Lote	144	0.00	100.00	Financiera: CREDITO FAIS A 3 AÑOS 8 MESES / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,940,800	\$1,940,800	\$1,940,800	\$1,940,800	\$1,940,800	\$1,940,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: CREDITO FAIS A 3 AÑOS 8 MESES / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,375,974	\$3,375,974	\$3,375,974	\$3,375,974	\$3,375,974	\$3,375,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	898	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$492,740	\$492,740	\$492,740	\$492,740	\$492,740	\$492,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$387,649	\$387,649	\$387,649	\$387,649	\$387,649	\$387,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	291	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,767,627	\$1,767,627	\$1,767,627	\$1,767,627	\$1,767,627	\$1,767,627	100.00	\$0	Metros lineales	225	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 30

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Pres
PUE15150300556575	Construcción De Nueva Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Jicolapa	2015082	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1
PUE15150300556597	Suministro Y Colocación De Techo Firme En (Ayehualulco Y Cuautlilulco) En El Municipio De Zacatlan, Puebla	2015083	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1
PUE15150300556609	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techados En Colonias Populares En Zonas Prioritarias Del Municipio De Zacatlan	2015084	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1
PUE15150300557281	Rehabilitación De La Escuela Preescolar 18 De Marzo En La Comunidad De Atzingo	2015095	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2015	
PUE15150400586552	Ampliación Del Alcantarillado Sanitario En La Colonia Plan De Ayutla, Perteneciente Al Municipio De Zacatlan Puebla	2015025	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	
PUE15150400586584	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Plan De Ayutla 2da Sección Perteneciente Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla	2015026	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	
PUE15150400587017	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Ayehualulco Y Maquixtla, Perteneciente Al Municipio De Zacatlan	2015080	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1
PUE15150400587066	Construcción De Pisos Firmes En Comunidades Con Rezago Social (Alto Y Medio) En El Municipio De Zacatlan	2015081	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1
PUE15150400587202	Construcción De Un Desayunador En Jardín De Niños Niñez Mexicana Cuautlilulco Clave 21djm0403m Primera Etapa	2015086	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2015	
PUE15150400587226	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 3ra Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Atzingo	2015087	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1
PUE15150400587246	Ampliación Del Alcantarillado Sanitario En La Colonia La Guadalupeana	2015089	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	
PUE15150400587287	Suministro Y Colocación De Techo Firme En Atzingo Ageb No. 0270 En El Municipio De Zacatlan	2015090	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	
PUE15150400587409	Construcción De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña	2015088	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3

Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones
	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$1,729,550	\$1,729,550	\$1,729,550	\$1,729,550	\$1,729,550	\$1,729,550	100.00	\$0	Metros lineales	3,151	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$204,902	\$204,902	\$204,902	\$204,902	\$204,902	\$204,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$541,038	\$541,038	\$541,038	\$541,038	\$541,038	\$541,038	100.00	\$0	Metros lineales	86	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$149,020	\$149,020	\$149,020	\$149,020	\$149,020	\$149,020	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,948,883	\$1,948,883	\$1,948,883	\$1,948,883	\$1,948,883	\$1,948,883	100.00	\$0	Piezas	144	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,855,779	\$1,855,779	\$1,855,779	\$1,855,779	\$1,855,779	\$1,855,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	739	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$630,520	\$630,520	\$630,520	\$630,520	\$630,520	\$630,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	193	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA FUE EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,487,382	\$1,487,382	\$1,487,382	\$1,487,382	\$1,487,382	\$1,487,382	100.00	\$0	Metros lineales	270	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$627,467	\$627,467	\$627,467	\$627,467	\$627,467	\$627,467	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$33,788	\$33,788	\$33,788	\$33,788	\$33,788	\$33,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Piezas	9,000	0.00	100.00	Financiera: 2,638,000.00 ESTATAL, 1.58 BENEFICIARIOS 700,000.00 DE FISM / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 30

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presu
PUE15150400587650	Trabajos Complementarios De La Obra Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Xoxnacatla	2015092	Puebla	Zacatlán	Xoxnacatla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	
PUE15150400589579	Adquisición De Equipo De Computopara El Desarrollo De Los Programas	2015015	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	1
PUE15150400589636	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficina Para El Desarrollo De Los Programas	2015040	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	
PUE15150400589826	Adquisición De Software De Contabilidad Gubernamental Para Los Servidores Públicos Del H. Ayuntamiento De Zacatlan	2015039	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	1

Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones
	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	R reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$40,278	\$40,278	\$40,278	\$40,278	\$40,278	\$40,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: \$ 40,277.93 EL MOTO TOTAL PAGADO CORRESPONDE A INTERESES BANCARIOS FISM 2015 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% CON LOS INTERES DEL FISM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$366,210	\$366,210	\$366,210	\$366,210	\$366,210	\$366,210	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$28,790	\$28,790	\$28,790	\$28,790	\$28,790	\$28,790	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	10	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Piezas	12	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
